


RAKENNUSTYÖMAALLA TAPAHTUU

Rakennustyö etenee aikataulussa. Ulkona on menossa asfaltointityöt etelän puoleisella piha-alueella.


Tällä viikolla on valmistunut mm: Portaiden laatoitustyöt ja järjestelmäläsisienien asennukset (puu).

Työmaalla käynnissä on listoitus, puuväliovien ja karmien asennus, salin seinän rimojen koolaukset, kaidetyöt, kodinkoneiden asennukset, palokatkotyöt, sekä keskuskeittiön massalattian viimeistelytyöt ja keittiölaiteasennukset.

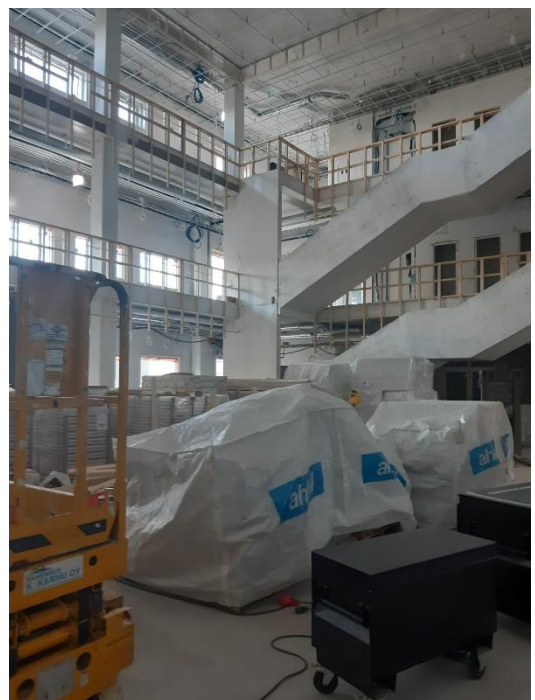

Seuraavana tulossa olevia työvaiheita ovat Rulo-verhojen asennus, salin + musiikkiluokan lattia-laatoitus, alakattojen ummistukset (sekä lattian suojien poistaminen samaan tahtiin). Tämä toteutetaan kolmannelta kerroksesta alaspäin, työmaavalvojan listaa noudattaen. Lisäksi on tulossa asfaltoidun alueen maalaukset ja massalattia tilaan A144.

Työmaan edetessä on ollut tarpeen tarkentaa suunnitelmia. Nyt on tarkistettu tontinkäyttösuunitelmaa puustopihaan ja kaupunkipuutarhaan tulevien puiden ja pensaiden kohdalla:

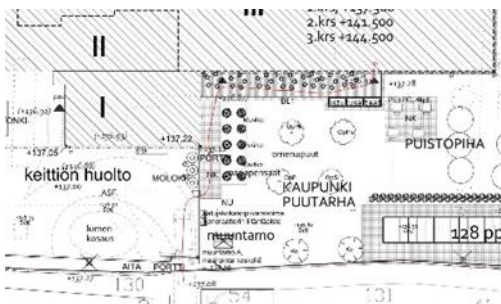

- Poistettu pihlajat pyörätien varresta ja vaihdettu tilalle pensaita
- Eteläisen vyöhykkeen omenapuu (Sandra) vaihdettu pohjoisemman vyöhykkeen vastaavaan (Heta)

Rakentamisen kädentaidot näkyvät kaupunkikuvassa: Tiesitkö, että julkisivutiiliä tuli yksittäin muurattavaksi yhteensä noin 80 000 kpl? Muuraus tehtiin viime talven aikana hupun alla suojassa.
